


Herzlich willkommen!

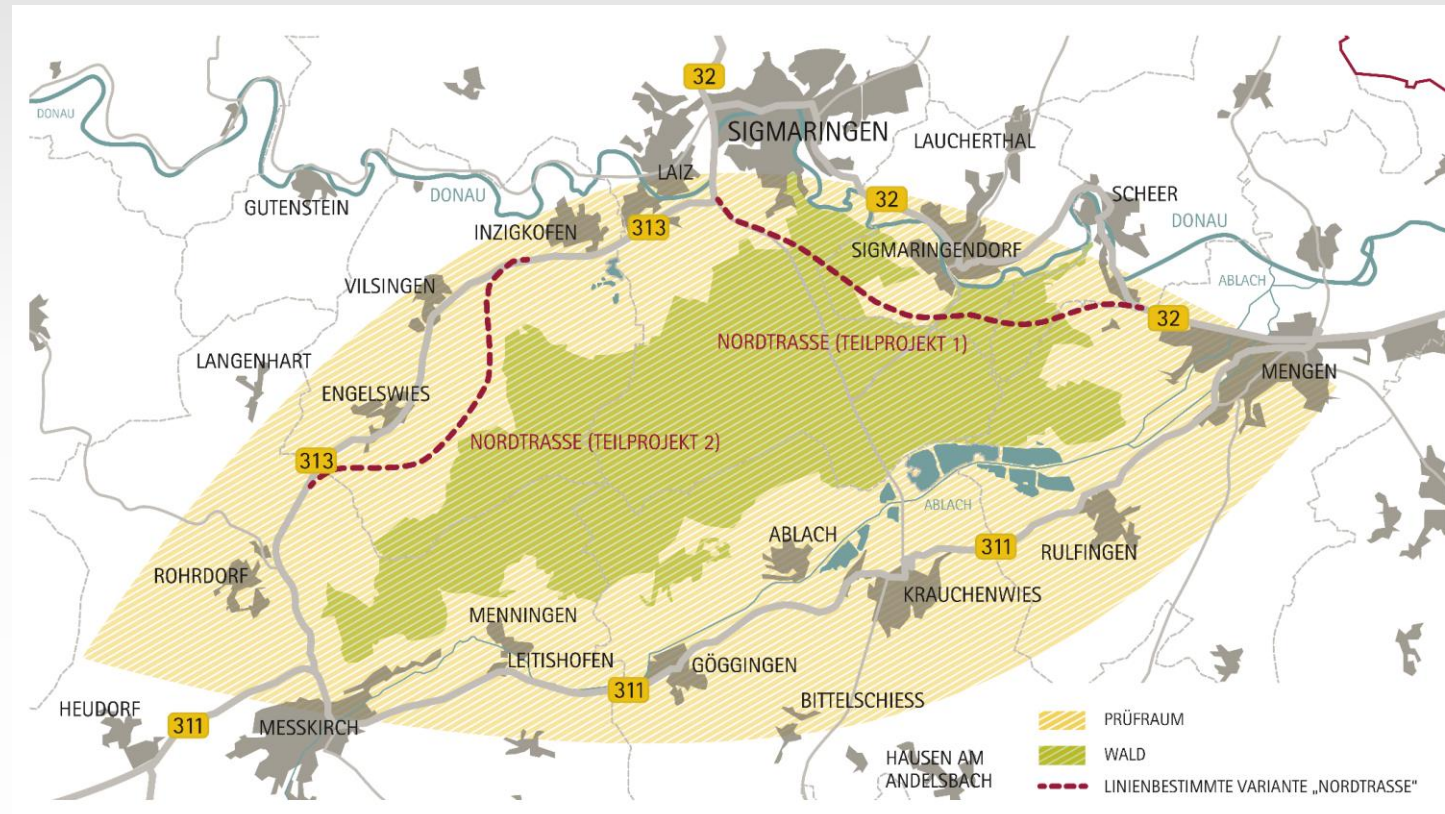

## Aktueller Stand in den Planungsprozessen

### **Fachgutachten Flora / Biotope**

- Kartierungen im Gelände wurden 10/2022 abgeschlossen (Untersuchungsgebiet ca. 16.000 ha)
- Erfassung von Biotoptypen
- Bemerkenswerte Vorkommen von Farn- und Blütenpflanzen
- Bis Ende 2022
  - abschließende Digitalisierung aller Felddaten
  - vorläufige Auswertung der Erhebungen
  - Bewertung der Biotope
  - Abschlussbericht

## Aktueller Stand in den Planungsprozessen

### Verkehrsgutachten

- Analysemodell ist kalibriert
- Für bisher 5 Planfälle wurden die Verknüpfungspunkte (Knotenpunkte) festgelegt
- Diese Festlegungen fließen in das Prognosemodell ein (Lage, Knotenpunktart)
- Bis Ende 11/2022 werden der Prognose-Nullfall und die 5 Planfälle

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Variante A1  | = Nordtrasse                              |
| Variante AB1 | = Nordtrasse mit Waldtrasse               |
| Variante C1  | = BI-Trasse (Trasse der Bürgerinitiative) |
| Variante D1  | = Südtrasse                               |
| Variante DE1 | = Südtrasse mit Grenzwegtrasse            |

berechnet sein

- weitere Erläuterungen zu TOP 3 bis 5 von Fachgutachterin Frau Köllermeier

## Aktueller Stand in den Planungsprozessen

### **Fachgutachten Verkehrslärm**

- Schalltechnisches Berechnungsmodell auf der Grundlage der Geobasisdaten ist erstellt
- In 11/2022 umfangreiche Ortsbegehungen im Bereich der bebauten Gebiete entlang der Varianten
- Datenschutz ist gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gewährleistet

### **Vermessung**

- Bildflug abgeschlossen (240 km<sup>2</sup>)
- Digitales Oberflächenmodell aus den Daten der Befliegung bis 11/2022
- Erstellung von True-Orthophotos (Testdaten werden aktuell geprüft)
- Klassifizierte Punktwolken (Testdaten werden aktuell geprüft)

## Aktueller Stand in den Planungsprozessen

### **Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)**

- Informeller Scoping Termin am 12.05.2022
- Bericht der Bestandsanalyse zur UVS inkl. Kartographie liegt im Entwurf vor (noch ohne Fachbeitrag Fauna und Vegetation)
- Biotoptypenkartierung / Fachbeitrag Vegetation bis Mitte 1. Quartal 2023
- Vorlage aller Fachgutachten und fachgebietsübergreifende Abstimmung Ende 1.Quartal 2023
- Danach Modifizierung / Optimierung der bisher vorliegenden Linienvarianten
- Entwicklung möglicher neuer Varianten / Untervarianten

## Aktueller Stand in den Planungsprozessen

### **Fachgutachten Geotechnik**

- Alle im gesamten Untersuchungsraum vorhandenen Bohrprofile wurden ausgewertet
- Erste Erkenntnisse zum Untergrund
- Erste Erkenntnisse zur Hydrogeologie
- Erste geotechnische Beurteilung der bisherigen 5 Varianten
- Kritische Bereiche / zu vermeidende Bereiche  
(z.B. Moorgebiete, Rutschungsgebiete, Quelfassungen, geschützte Geotope)
- Fragen können unter TOP 6 an den anwesenden Fachgutachter Herr Stadel gestellt werden

## Aktueller Stand in den Planungsprozessen

### Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung


- Workshop am 09.07.2022 mit über 40 Teilnehmenden
- Exkursion am 23.07.2022 mit etwa 30 Teilnehmenden
- Ergebnisse / Hinweise / Vorschläge / Ideen aus dem Workshop werden derzeit ausgewertet und aufbereitet
- Öffentliche Veranstaltung (voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023) hinsichtlich Beurteilung und Berücksichtigung der eingebrachten Beiträge aus dem Workshop in der weiteren Planung

## Aktueller Stand in den Planungsprozessen

### Objektplanung Verkehrsanlagen

- Für die vorgegebenen 5 Varianten wurden die Trassen (Linienführung), die Gradienten (Höhenpläne) und die Knotenpunkte entwickelt
- Erste Optimierungen der 5 Varianten (Trassen, Gradienten) wurden vorgenommen (Groblinien)
- Neue Alternativen / Varianten in Untersuchung nach Vorliegen der Raumanalyse (in Bearbeitung bis Ende 1. Quartal 2023)
- Fachgebietsübergreifende Abstimmung u. Entwicklung der vorliegenden Varianten (in Bearbeitung bis Ende 1. Quartal 2023)
- Fachgebietsübergreifende Abstimmung u. Entwicklung neuer Varianten (in Bearbeitung bis Ende 2. Quartal 2023)
- Fragen können unter TOP 6 an den anwesenden Fachplaner Herr Zimmermann gestellt werden



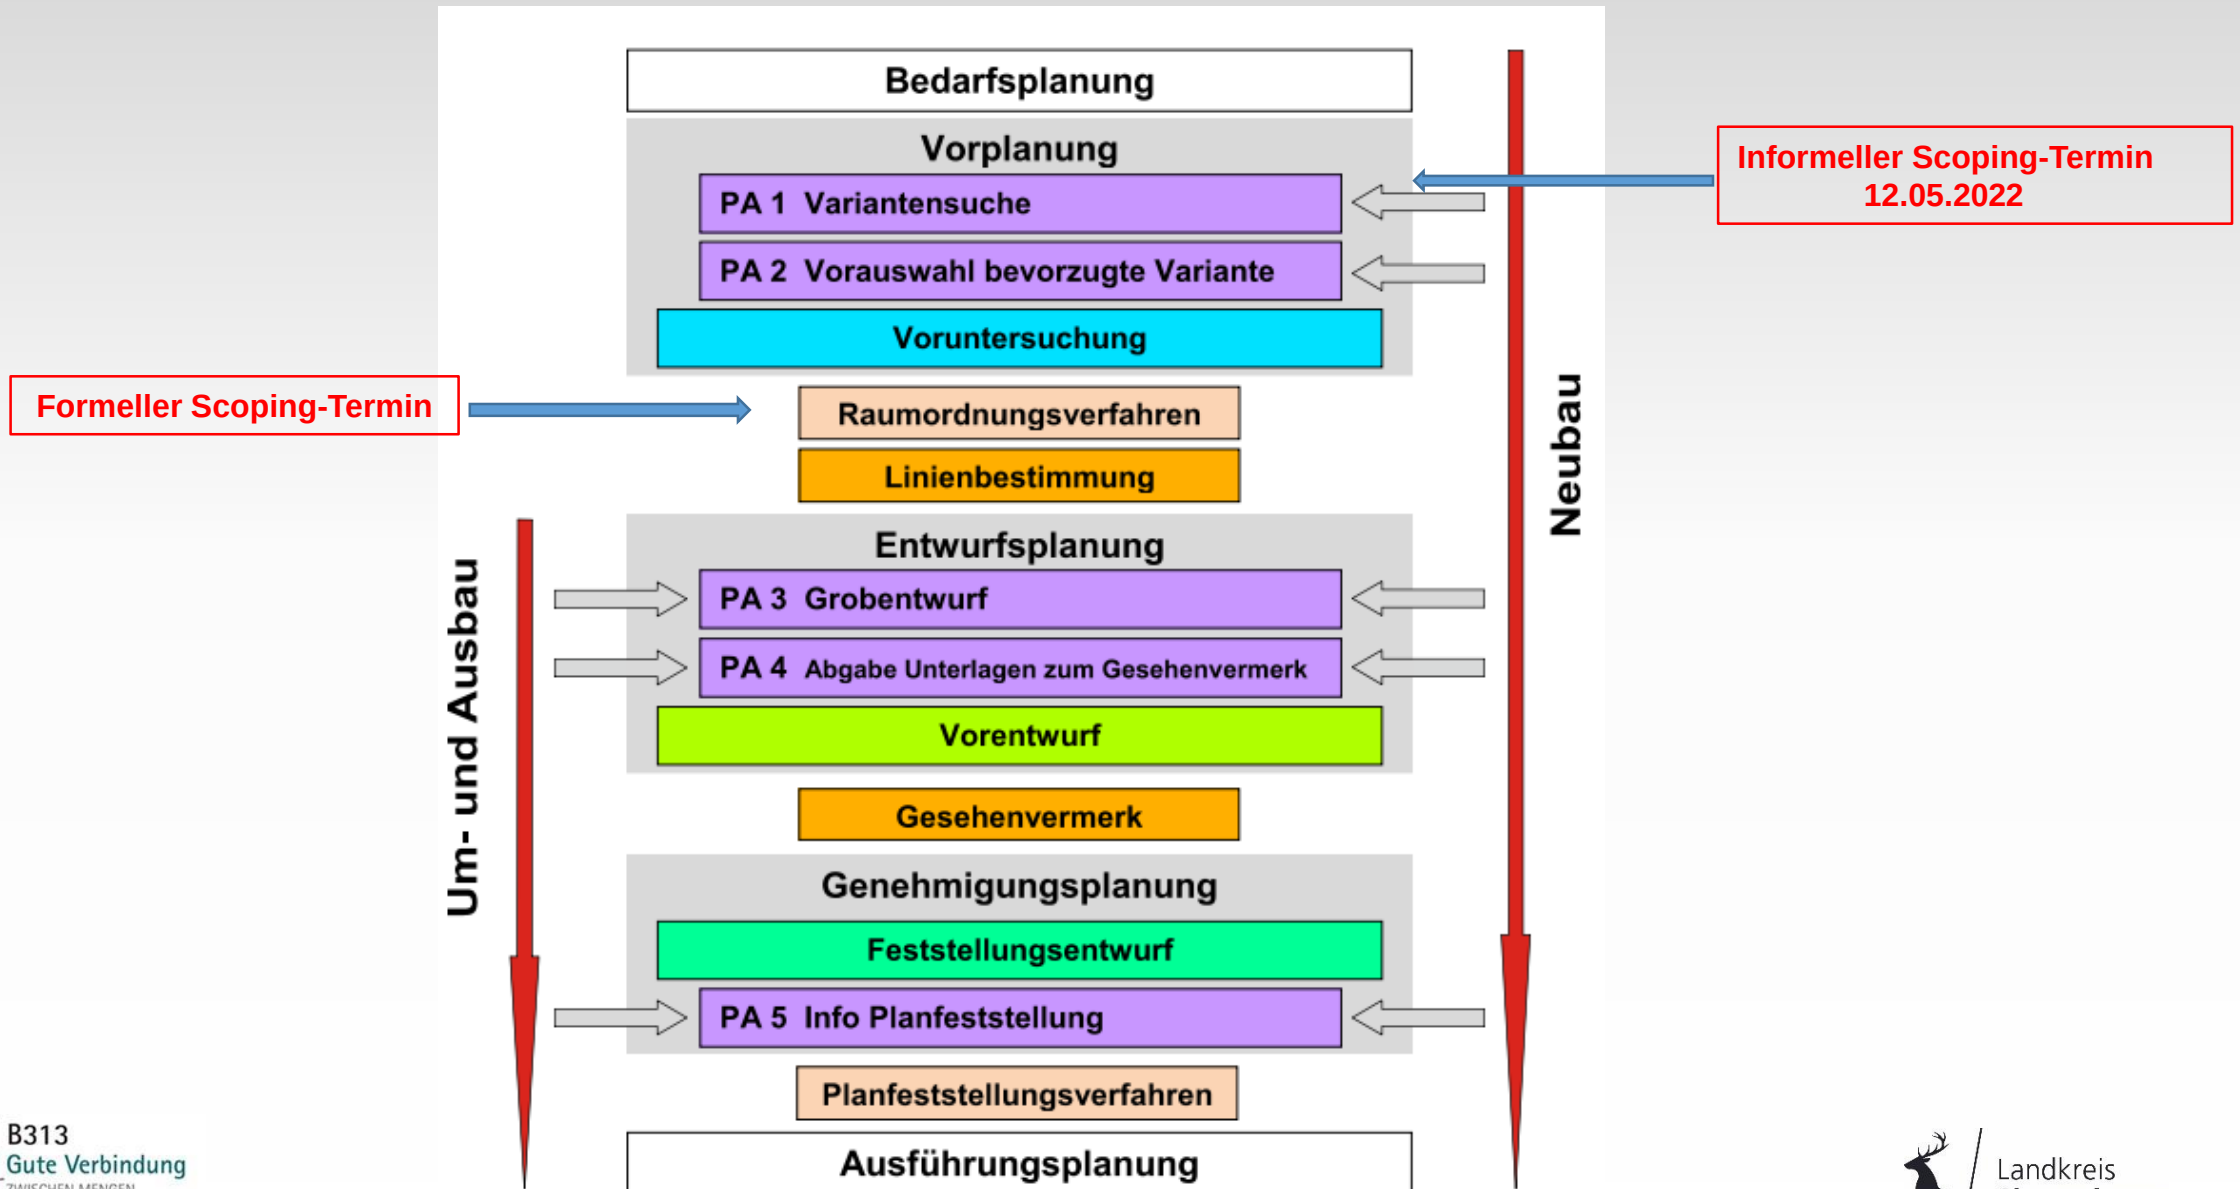

| Kostenermittlung durch die<br>Auftragsverwaltung                      | Projekt- und Kostenabstim-<br>mung im Prozess nach RE                               | Kostenüberprüfung<br>durch BMVBS |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kostenrahmen<br>Bedarfsplan                                           |                                                                                     | Bedarfsplan                      |
|                                                                       | ProjektAbstimmung 1<br>Variantensuche                                               |                                  |
| Kostenschätzung<br>Voruntersuchung                                    | ProjektAbstimmung 2<br>Vorauswahl bevorzugte Variante<br>inklusive Kostenabstimmung |                                  |
| Aktualisierung der<br>Kostenschätzung<br>Voruntersuchung              |                                                                                     | Linienbestimmung                 |
| Aktualisierung Kosten-<br>schätzung / Kostenberechnung<br>Grobentwurf | ProjektAbstimmung 3<br>Grobentwurf<br>inklusive Kostenabstimmung                    |                                  |
| Kostenberechnung<br>Vorentwurf                                        | ProjektAbstimmung 4<br>Abgabe Unterlagen zum<br>Gesehenvermerk                      | Erteilung Gesehenvermerk         |
| Aktualisierung der<br>Kostenberechnung<br>Feststellungsentwurf        | ProjektAbstimmung 5<br>Info Planfeststellung<br>inklusive Kostenabstimmung          |                                  |
| Fortsetzung von<br>Kostenermittlung                                   |                                                                                     | Haushaltseinstellung             |
|                                                                       |                                                                                     | Fortsetzung<br>Kostenüberprüfung |

## Aktueller Stand in den Planungsprozessen

### **Bund-Länder-ProjektAbstimmung PA 1**

Folgende Bund-Länder-ProjektAbstimmungen sind vorgesehen:

- ProjektAbstimmung 1 Variantensuche,
- ProjektAbstimmung 2 Vorauswahl der bevorzugten Variante,
- ProjektAbstimmung 3 Grobentwurf,
- ProjektAbstimmung 4 Abgabe Unterlagen zum Gesehenvermerk,
- ProjektAbstimmung 5 Info Planfeststellung.

## Aktueller Stand in den Planungsprozessen

### Bund-Länder-ProjektAbstimmung PA 1

#### **Zielstellung**

Die ProjektAbstimmung 1 unterstützt die Variantensuche. Sie soll nach der innerhalb der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) erfolgten Planungsraumanalyse auf der Grundlage einer groben Linienplanung stattfinden. Die Abstimmung dient insbesondere auch der Kontrolle der Bedarfsplankonformität.

## Aktueller Stand in den Planungsprozessen

### Objektplanung Verkehrsanlagen

→ Anstehende wichtige Termine werden aktuell vorbereitet:

#### Regierungspräsidium Tübingen

- Vorstellung Groblinien Trassierung, Gradienten Knotenpunkte, Großbauwerke (schematisch)
- Vorstellung Verkehrsuntersuchung
- Bestimmung Straßenkategorie, Verbindungsfunktionsstufe, Entwurfsklasse
- Vorbereitung Bund-Länder-Abstimmung (PA 1)

## Aktueller Stand in den Planungsprozessen

### Objektplanung Verkehrsanlagen

→ Anstehende wichtige Termine werden aktuell vorbereitet:


#### Bund-Länder-Projektabstimmung PA 1

- Vorstellung Groblinien Trassierung, Gradienten Knotenpunkte, Großbauwerke (schematisch)
- Vorstellung Verkehrsuntersuchung
- Verbindliche Festlegung Straßenkategorie, Verbindungsfunktionsstufe, Entwurfsklasse
- Vorstellung der Zwischenergebnisse des bisherigen Variantenvergleichs
- Festlegung der vertieft zu untersuchenden Varianten (ggf. neue Varianten)
- Festlegung Termin Projektabstimmung PA 2

→ Terminabstimmung wird zwischen Land Baden-Württemberg und Bund durchgeführt


→ Bund-Länder-Abstimmung führt das Land durch, der Landkreis wirkt als Planungsträger mit

## Aktueller Stand der Planungsprozesse

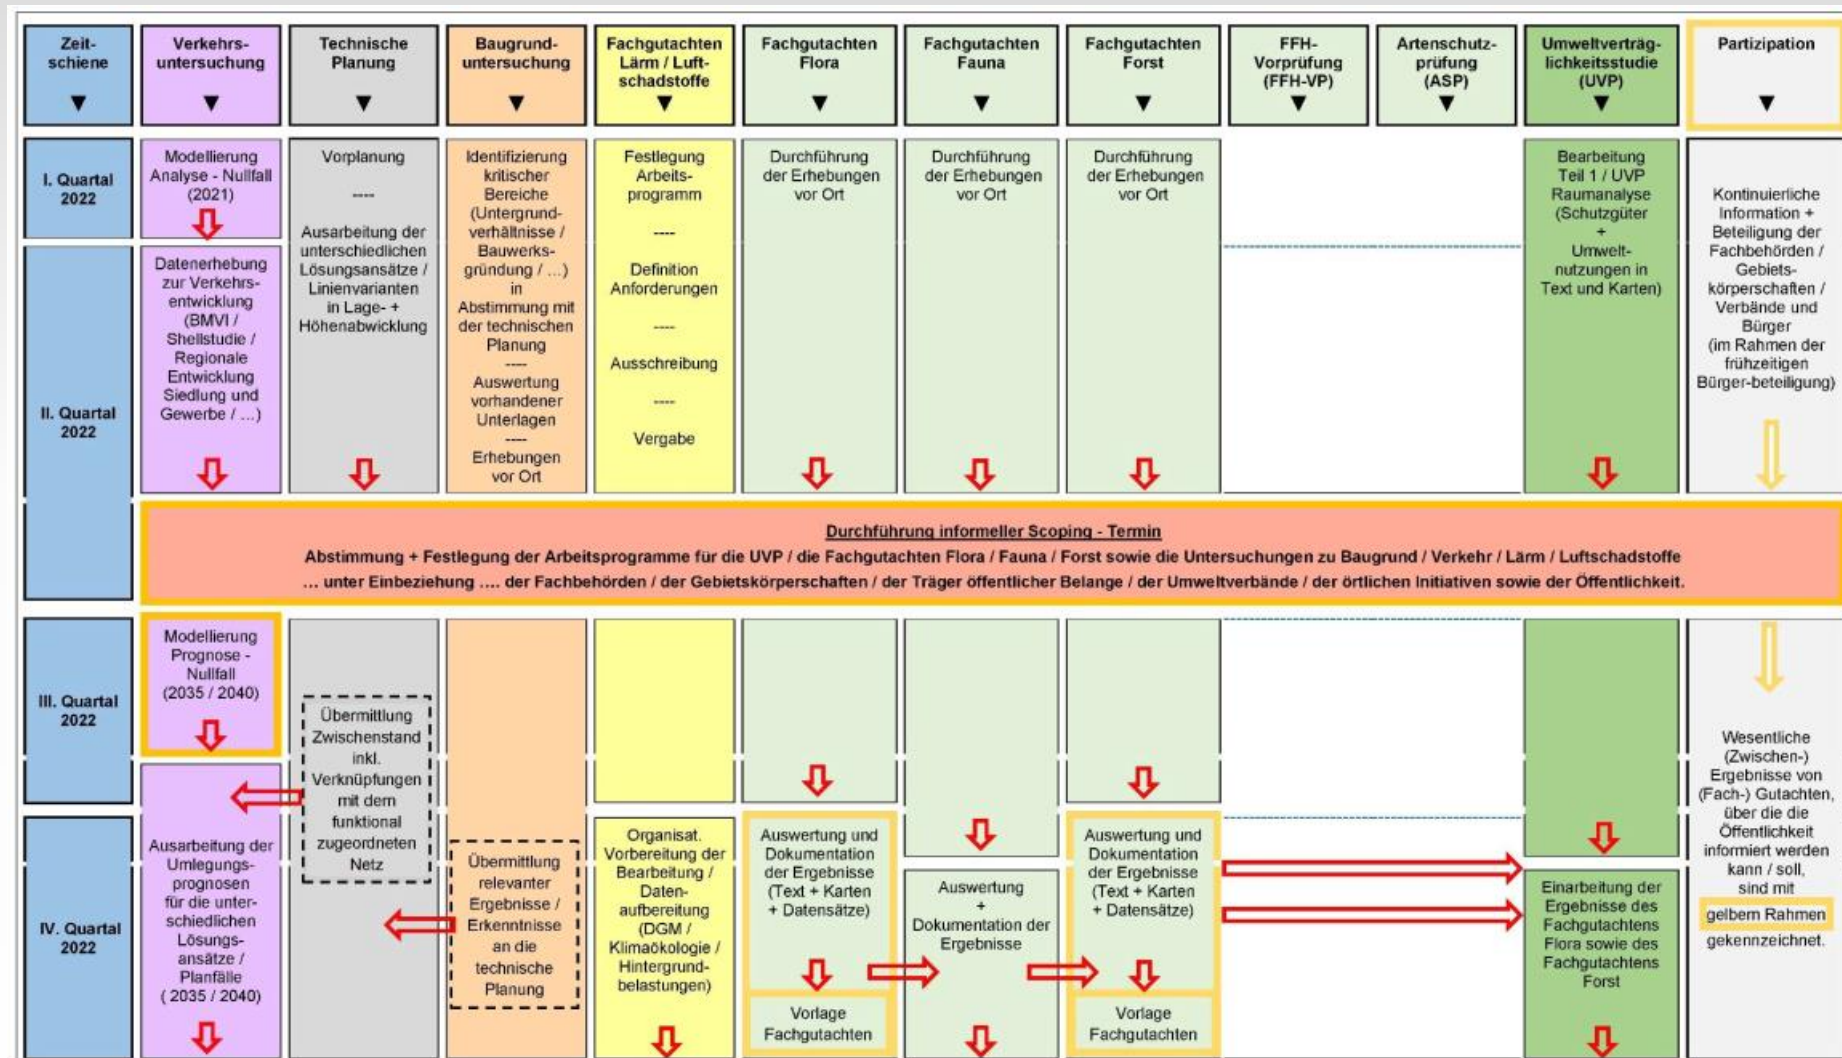



## Aktueller Stand der Planungsprozesse

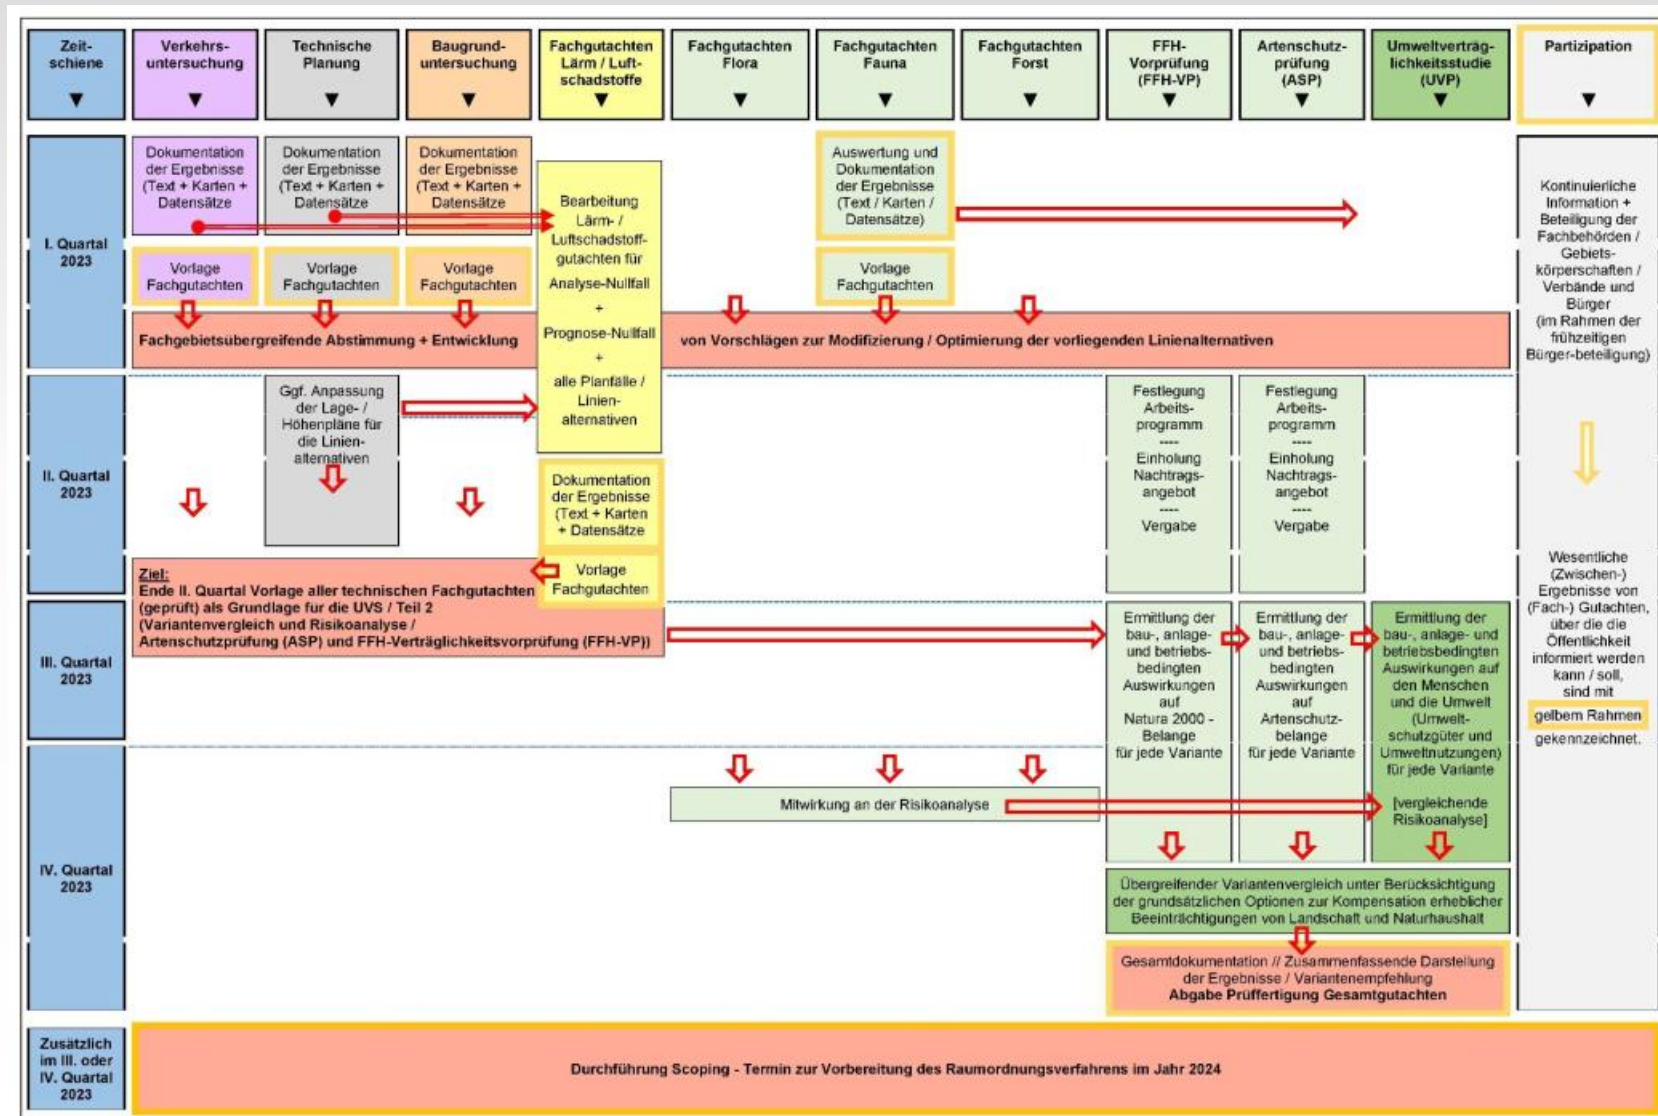





**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.**
